

# 喬木村内リニア関連事業の進捗状況について

2021年 4月21日(水) 19:00～ 於:防災センター



喬木村役場

\* 堰下 道路拡幅について

③伊久間工場団地造成事業

④阿島北宅地造成事業

**\* 堰下 道路拡幅について**

③伊久間工場団地造成事業

④阿島北宅地造成事業

## 堰下 村道拡幅工事の状況



# 堰下 村道拡幅工事の状況



# 堰下 村道拡幅工事の状況



# 堰下 村道拡幅工事の状況



# 堰下 村道拡幅工事の状況





# 堰下 村道拡幅工事の状況




# 堰下 村道拡幅工事の状況



## 堰下 村道拡幅工事の状況



## 堰下 村道拡幅工事の状況

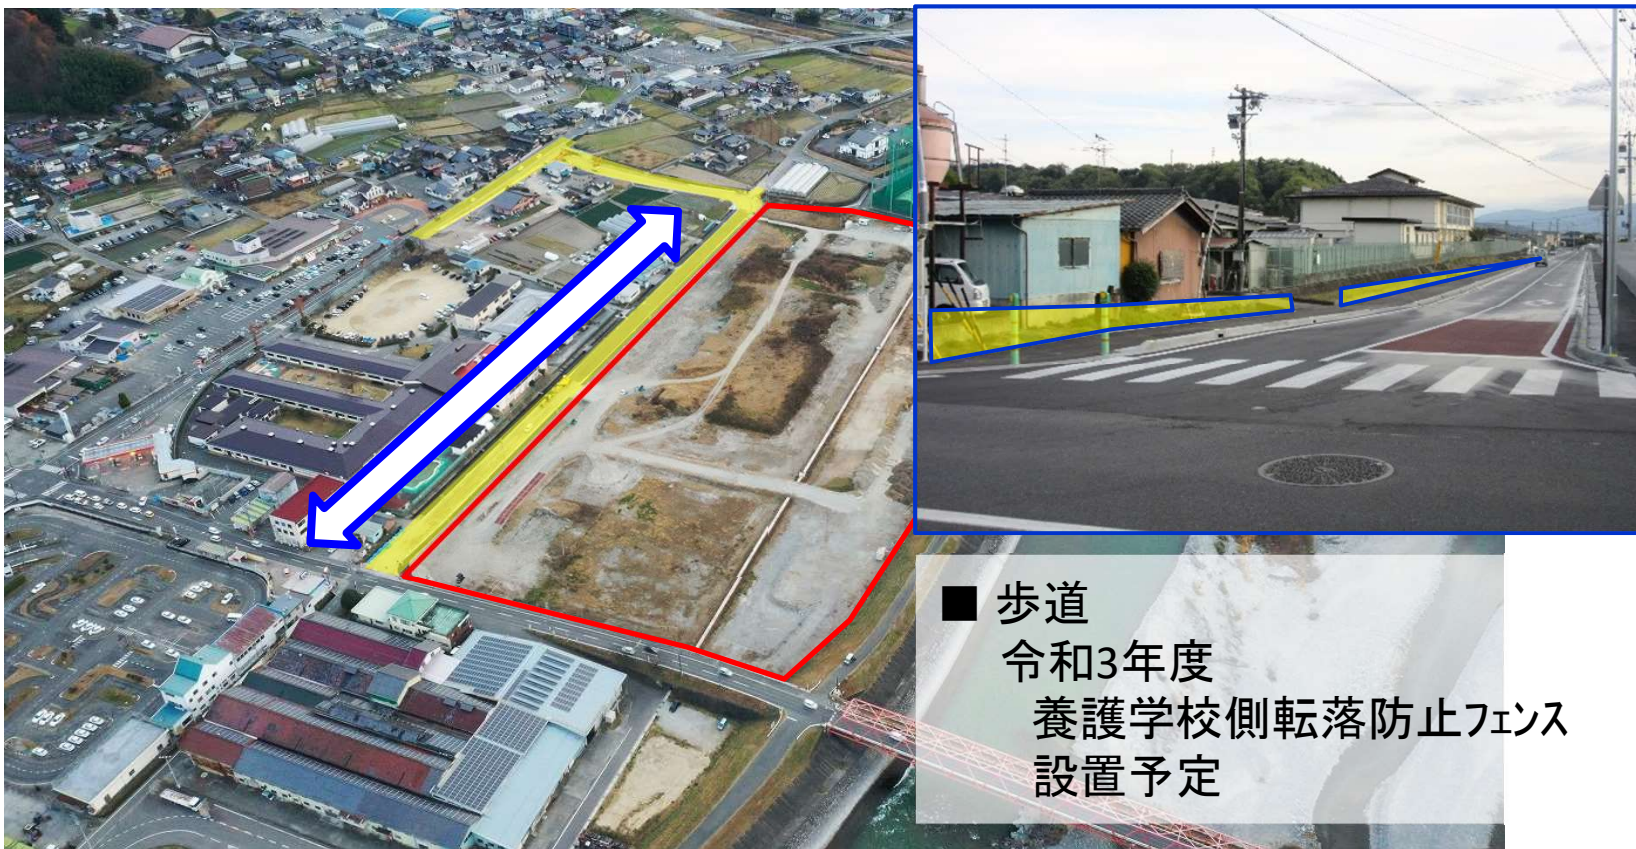

本日のご報告事項

---

\* 堰下 道路拡幅について

③伊久間工場団地造成事業

④阿島北宅地造成事業

## 伊久間工場団地造成事業



### 【搬出工事】

■ 請負業者: 中川建設有限会社

□ 工事期間: 完了

### 【造成工事】

■ 造成1工区(工1南側): 中川建設有限会社

■ 造成2工区(工1北側): 大平建設株式会社

■ 付替道路建設: 野島建設株式会社

□ 工事期間: ~令和3年8月末

## 伊久間工場団地造成事業

### 【盛土搬入】

#### ・大鹿村 リニア発生土

→ R2.12~R3.3

→ 約3万 $\text{m}^3$  (完了)

#### ・三遠南信道 発生土

→ R3.3~R3.4(予定)

→ 約5千 $\text{m}^3$

#### ・松川ダム浚渫土

→ R3.4~R3.5(予定)

→ 約1千 $\text{m}^3$ (4/20現在)



## 伊久間工場団地造成事業





## 伊久間工場団地造成事業



## 伊久間工場団地造成事業



本日のご報告事項

---

\* 堰下 道路拡幅について

③伊久間工場団地造成事業

④阿島北宅地造成事業

## 阿島北宅地造成事業の概要



## 阿島北宅地造成事業の概要




□計画エリア  
約0.6ha  
現況（田・公衆用道路）

■令和2年度  
用地取得済み  
農振除外・農転済み


■令和3年度  
造成工事  
（夏以降に着手予定）

## 阿島北宅地造成事業の概要

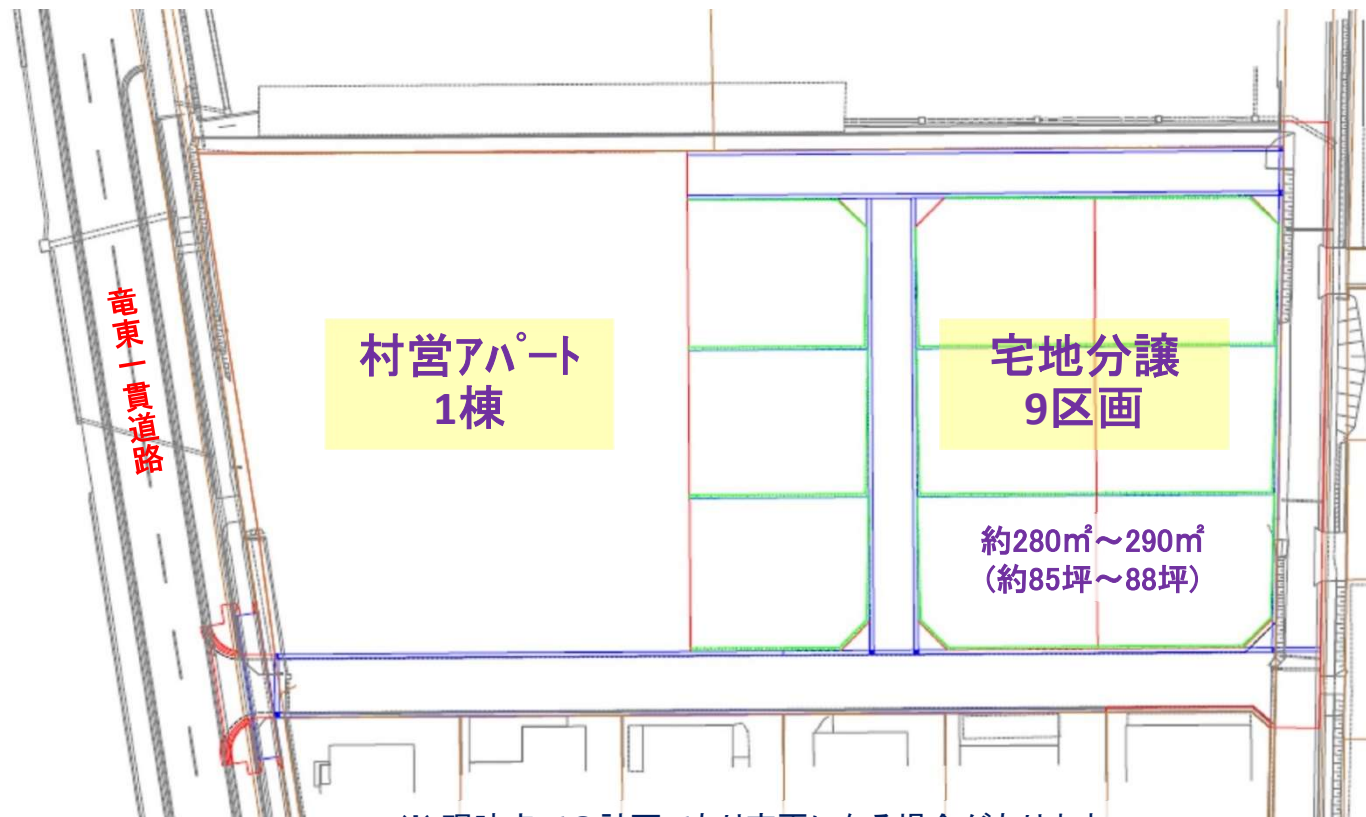

※ 現時点での計画であり変更になる場合があります

## 阿島北宅地造成事業の概要

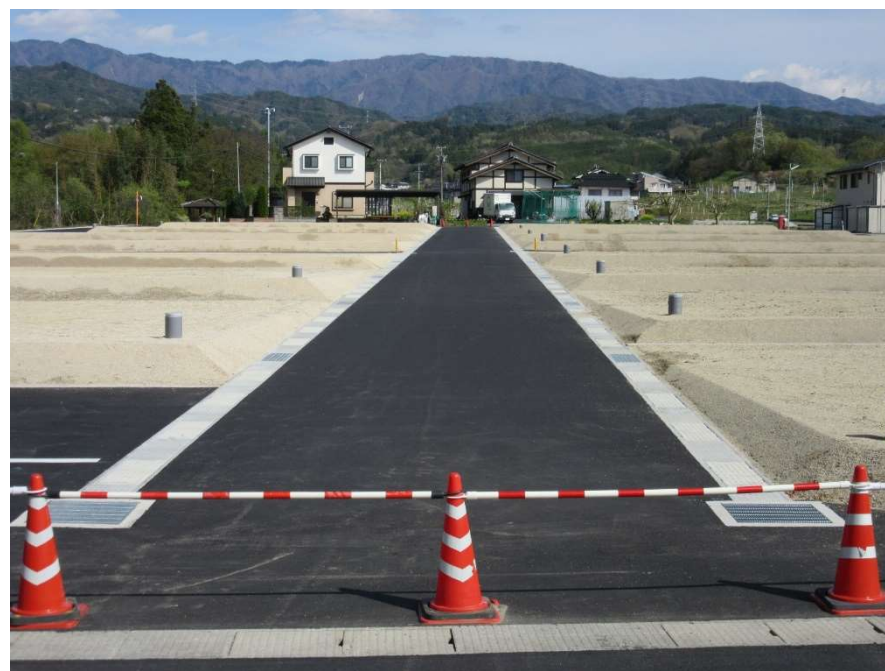

【イメージ】  
帰牛原中原地区宅地分譲地
