

# 天竜川橋りょうほか新設 工事だより

## 組合回覧

### 天竜川JV

早春の候、皆さま益々のご清祥のこととお喜び申し上げます。


工事は、河川内では上部工、高架橋区間においては引き続き橋脚工事を行っています。また、天竜川対岸の飯田市側では、2基の橋脚基礎工事において夜間に所定の深さに落とし込むための掘削工事を行っています。高架橋基礎および飯田市側橋脚基礎の掘削工事に伴う発生土は、堰下ヤードへ運搬を行っています。

交通規制は、村道115号、土井場沢川堤防道路、村道102号、村道112号(迂回路あり)の通行止めを引き続き行います。また、竜東一貫道路において3月下旬に2日間程度の片側交互通行を予定しています。(裏面参照)

安全・環境に十分な配慮を行いながら工事を進めてまいりますので、これからもご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

敬具

### 工事の状況

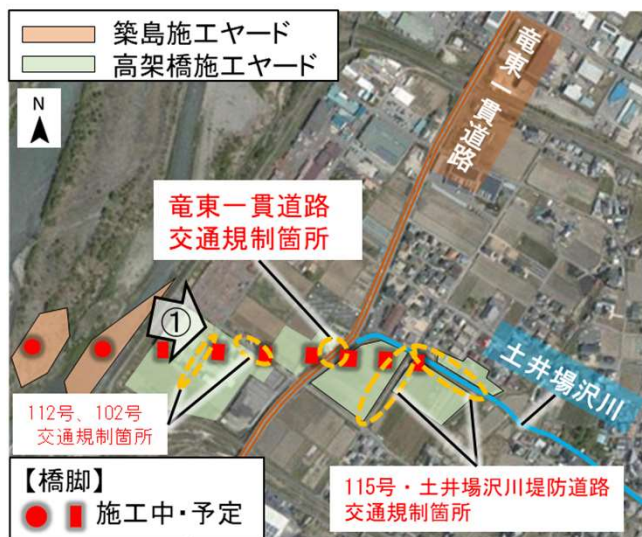

工事箇所全体図



橋脚工事の様子

※本線工事のヤード等として、一部の土地を借地して使用させていただきたいと考えております。ご協力いただきたい方にはご相談に伺います。

### 工程表

工種		令和6年			
		3月	4月	5月	6月
竜東一貫道路東側	橋脚工	■			
竜東一貫道路西側	橋脚工	■			
天竜川河川内	上部工	■			

### 工事車両の運搬

中央新幹線 N-08

001

○資機材(コンクリート除く)運搬時間:6時~19時  
(特殊車両:法令により21時~5時)

○発生土運搬車両には、《オレンジ》のステッカーを貼り走行します。

○橋脚工事で4/5(金)、4/9(火)、4/12(金)、4/22(月)、4/26(金)、上部工工事で3/22(金)、4/19(金)にコンクリート打設を予定しています。また、コンクリートの運搬・打設作業は6時~20時を予定しています。地域の皆様にはご迷惑をお掛けしますが、事故等に注意し、安全運行に努めてまいりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。

※天候、工事の進捗等により日程、時間に変更になる場合は、事前に村内放送等でお知らせします。


喬木村内における主な工事車両の運搬ルート

【天竜川工区】

資機材運搬台数  
片道約 150台/日 (3,4月最大)  
(コンクリート打設日：3/22, 4/5, 4/9, 4/12, 4/19, 4/22, 4/26)  
※工事の進捗により打設日を変更しております。  
(2/28→4/5, 3/6→4/12, 3/19→4/26)

【凡例】

- 天竜川工区
- 資機材 (コンクリート除く) 運搬ルート
- 資機材 (コンクリート) 運搬ルート
- - - 発生土運搬ルート (天竜川工区 喬木村側)
- - - 発生土運搬ルート (天竜川工区 飯田市側 & 県駅工区)

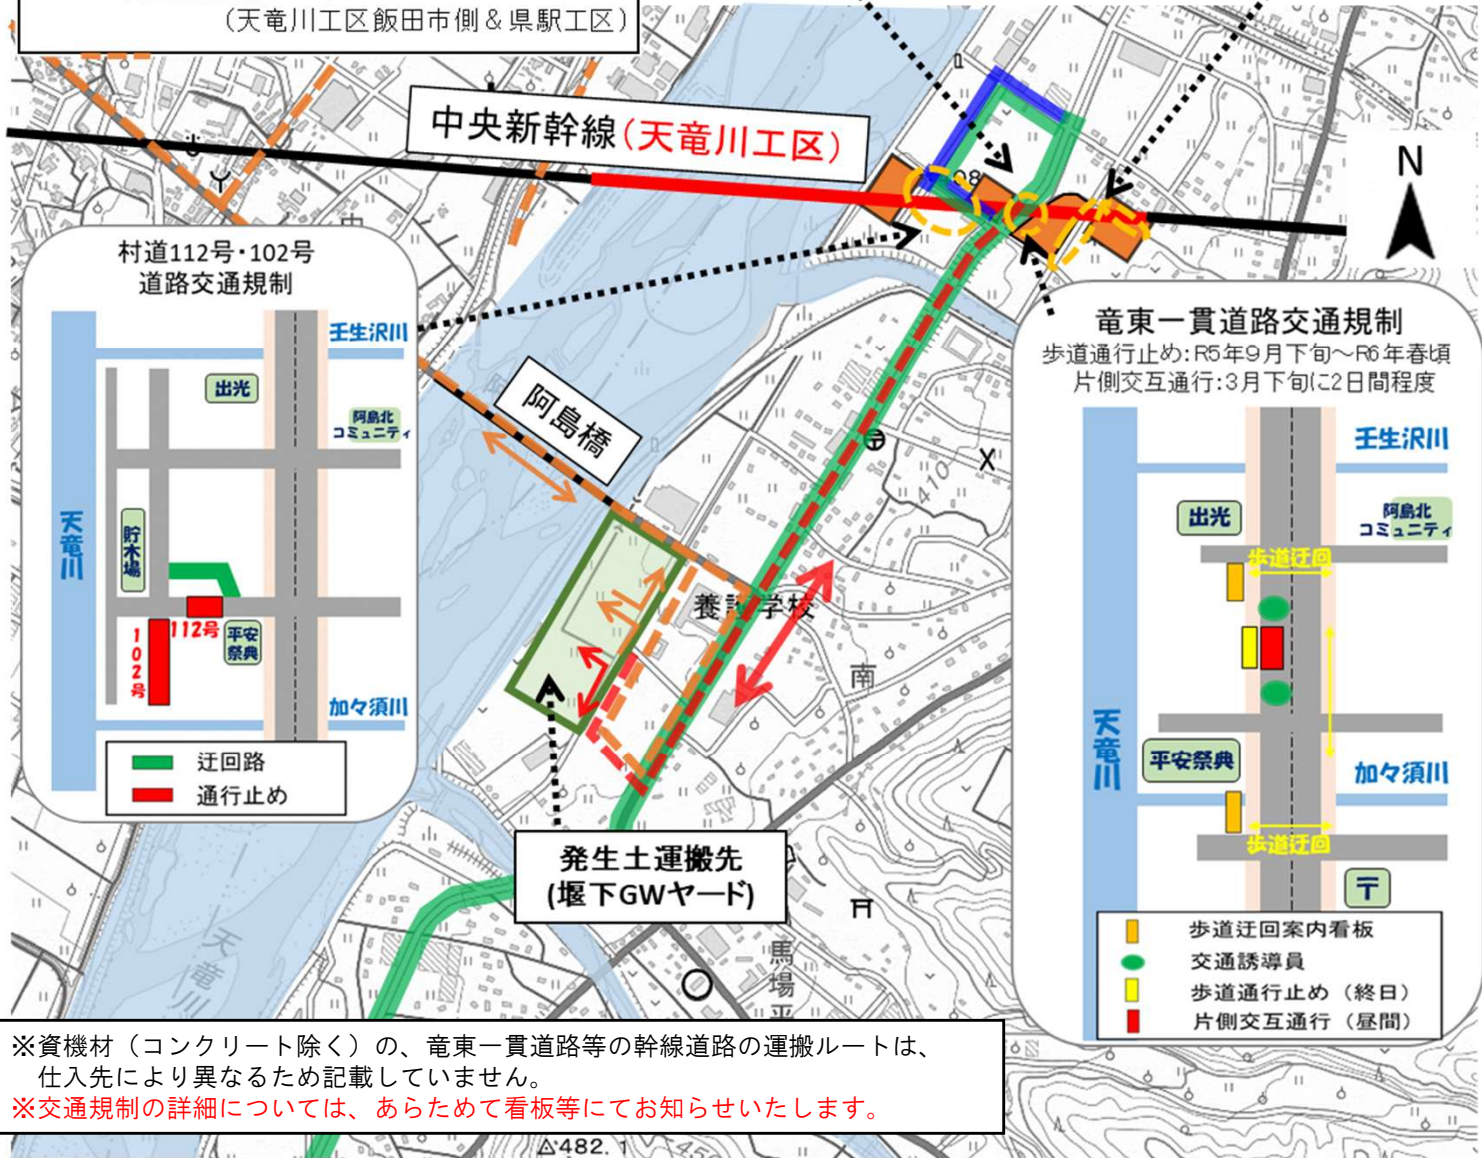

※資機材 (コンクリート除く) の、竜東一貫道路等の幹線道路の運搬ルートは、仕入先により異なるため記載していません。  
※交通規制の詳細については、あらためて看板等にてお知らせいたします。

【JR東海長野工事事務所からのお知らせ】

飯田市における中央新幹線長野県駅 (仮称) 新設工事で発生する発生土を堰下GWヤードに運搬しています。運搬台数は片道約60台/日 (最大) で、運搬期間は令和6年3月下旬頃までを予定しております (工事進捗により運搬期間に変更が生じる可能性があります)。ご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。

【問い合わせ先：JR東海中央新幹線長野工事事務所 0265-38-6500】

【天竜川工区に関する問い合わせ先】

施工業者：中央新幹線天竜川橋りょうほか新設工事共同企業体  
(構成員：三井住友建設(株)・極東興和(株)・ドーピー建設工業(株)・吉川建設(株))  
現場事務所：喬木村400-61  
電話番号：0265-48-6704 (9:00~18:00 土日・祝日・長期連休を除く)
